

最高裁判所耐震改修 2 期工事

0Aフロアー 製作図

([REDACTED])

[REDACTED] 改修

承諾図

最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者
		

株式会社 エヌテック

OAフロア工事仕様書

1. 工事概要

- (1) 工事名称： 最高裁判所耐震改修2期工事
 (2) 工事場所： 東京都千代田区隼町4-2
 (3) 発注者： 最高裁判所事務総局 経理局
 (4) 設計・監理： 最高裁判所事務総局経理局営繕課
 (5) 施工： 鹿島建設株式会社

2. 適用図書

下記の適用図書に基づいて施工図を作成し
 承諾を受けた後、製作・施工する。

- (1) 本設計図及び特記仕様書
 (2) 特記仕様書
 (3) 共通仕様書

		耐震性能	3000N 水平震度1.0G	
床パネル		種別	標準パネル	切欠パネル
		名称	OP2-3R (スチール ウッドコアパネル)	OP2-3WR (スチール ウッドコアパネル)
		サイズ	500×500×20	
		重量	5.0kg/枚	4.9kg/枚 (ワイヤリングカバー含む)
	材質	トップシート	溶融亜鉛めっき鋼板 t0.55	
		ボトムシート	溶融亜鉛めっき鋼板 t0.4	
		コア材	パーティクルボード t18	
ワイヤリングカバー		---	溶融亜鉛めっき鋼板t2.2	

支持脚		床高	H=80	
		種別	FX2脚	
		材質	スチール + ポリプロピレン	
	表面仕上げ	支持ボルト	電気亜鉛めっき	
		支持パイプ	---	
		カシメナット	電気亜鉛めっき	
		トッププレート	溶融亜鉛めっき鋼板	
		ベースプレート	溶融亜鉛めっき鋼板	
脚部 接着剤	商品名	ディノグリップ333 α (ノーテプ工業株式会社製)		
	材質	ウレタン系接着剤		

ワイヤブッシング (S=1/2)

全ての穴に6mm×7mmの
穴検出し口(2箇所/枚)を備えています

【表面】 【側面】 【裏面】

配係は、配係の大きさ(直径)・数量に
応じて各配係取出し口から取り出すこと
ができます。(下表参照)

<注意1>
通常はAの状態でパネルを配置して下さい。
Bの状態のままで、パネル・ケーブルや機器類
が落ち込む恐れがあります。

<注意2>
下表の配係量を超えますと、ケーブルの破損
の原因になります。


機器名	ケーブル外径	配線引出し口開口部	
		入側	出側
OAタップ	φ13		2本
PC直流、DC-DC、OAタップ	φ9		3本
PC用アソシエーターケーブル	φ8		4本
LANケーブル	φ6	3本	6本
25ピンアソシエーターケーブル	3×5	10本	18本

11



【1×2平脚タイプ】
※端部のみ使用

[illegible]

ボーダーカットパネル寸法 (有効45以上118.5未満)

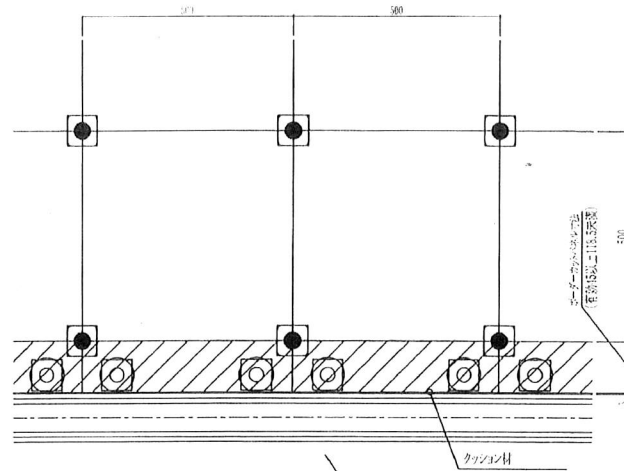

ボーダーカットパネル寸法 (有効118.5以上)

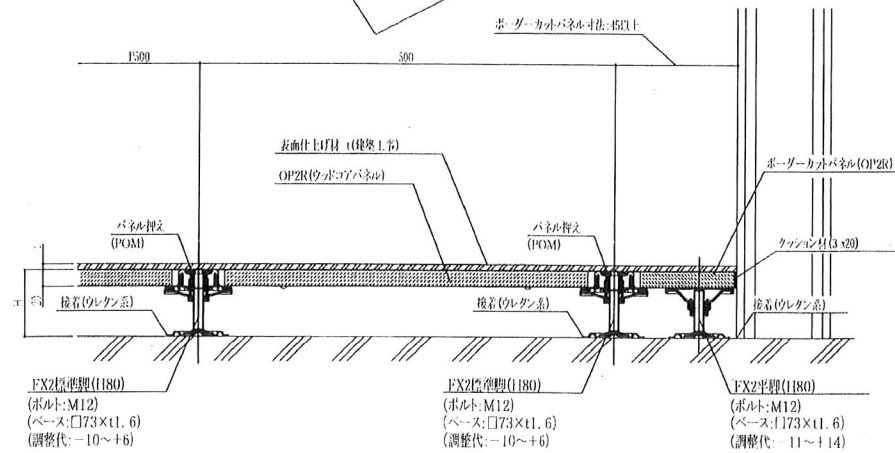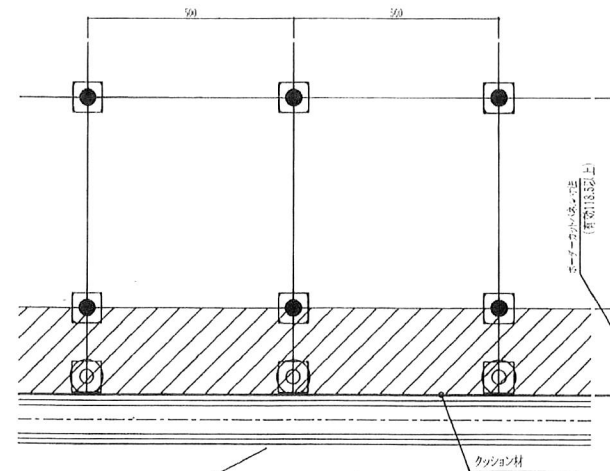

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

株式会社エヌテック

最高裁営繕課

鹿島建設株式会社



最高裁庁舎耐震改修2期工事

OAフロア納まり図(2)

XU-4868-仕4



